


Projekt Detaildaten

EDV SYS

Nr.	PSP-Code	Bezeichnung	Fortschr.	Status	Verantw.	Termine				Ressourcen (PT)				Kosten (€)				Import		Kommentar	
						Basis Termine		Aktuelle Termine		SUMME				SUMME				Quelle	Datum		
						Start	Ende	Start	Ende	Basis	Ist	Rest	Aktuell	Abw.	Basis	Ist	Rest				Aktuell
1	1	EDV SYS	0%	grün		02.07.08	14.03.09	02.07.08	14.03.09	516,0	160,0	356,0	516,0	0,0	303.700	83.750	219.950	303.700	0		
2	1.1	PROJEKTMANAGEMENT	0%	grün		02.07.08	07.03.09	02.07.08	07.03.09	54,0	27,0	27,0	54,0	0,0	30.250	15.250	15.000	30.250	0		
3	1.1.1	Projekt gestartet	0%	grün		02.07.08	02.07.08	02.07.08	02.07.08					0,0			0				
4	1.1.2	Projektstart	0%	grün	Maier	02.07.08	13.07.08	02.07.08	13.07.08	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	10.750	10.750	0	10.750	0		
5	1.1.3	Projektkoordination	0%	grün	Maier	02.07.08	07.03.09	02.07.08	07.03.09	5,0	2,0	3,0	5,0	0,0	2.500	1.000	1.500	2.500	0		
6	1.1.4	Projektkontrolling	0%	grün	Maier	27.07.08	25.02.09	27.07.08	25.02.09	23,0	7,0	16,0	23,0	0,0	11.500	3.500	8.000	11.500	0		
7	1.1.5	Projektabschluss	0%	grün	Maier	03.03.09	07.03.09	03.03.09	07.03.09	8,0		8,0	8,0	0,0	5.500		5.500	5.500	0		
8	1.1.6	Projekt abgeschlossen	0%	grün		07.03.09	07.03.09	07.03.09	07.03.09			0,0		0,0			0				
9	1.2	IST-ANALYSE U. ENTSCHEID. VAR.	0%	grün		02.07.08	24.08.08	02.07.08	24.08.08	55,0	47,0	8,0	55,0	0,0	27.700	23.500	4.200	27.700	0		
10	1.2.1	Ist-Analyse Infrastruktur	0%	grün	Bene	02.07.08	13.07.08	02.07.08	13.07.08	8,0		8,0	8,0	0,0	4.000		4.000	4.000	0		
11	1.2.2	Ist-Analyse HW	0%	grün	Dell	02.07.08	20.07.08	02.07.08	20.07.08	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	5.000	5.000	0	5.000	0		
12	1.2.3	Ist-Analyse SW	0%	grün	Gates	02.07.08	27.07.08	02.07.08	27.07.08	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	10.000	10.000	0	10.000	0		
13	1.2.4	Dokumentation Ist-Analyse	0%	grün	Maier	20.07.08	27.07.08	20.07.08	27.07.08	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	3.600	3.500	100	3.600	0		
14	1.2.5	Ist-Analyse abgeschlossen	0%	grün		27.07.08	27.07.08	27.07.08	27.07.08			0,0		0,0			0				
15	1.2.6	Definition Varianten	0%	grün	Maier	30.07.08	03.08.08	30.07.08	03.08.08	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	1.500	1.500	0	1.500	0		
16	1.2.7	Beschreibung Varianten	0%	grün	Doku	06.08.08	10.08.08	06.08.08	10.08.08	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	1.500	1.500	0	1.500	0		
17	1.2.8	Präsentation	0%	grün	Sprenger	13.08.08	17.08.08	13.08.08	17.08.08	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	1.600	1.500	100	1.600	0		
18	1.2.9	Entscheidung Variante	0%	grün	Maier	20.08.08	24.08.08	20.08.08	24.08.08	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	500	500	0	500	0		
19	1.2.10	Variante entschieden	0%	grün		24.08.08	24.08.08	24.08.08	24.08.08			0,0		0,0			0				
20	1.3	DETAILPLANUNG	0%	grün		27.08.08	03.10.08	27.08.08	03.10.08	93,0	79,0	14,0	93,0	0,0	52.000	40.500	11.500	52.000	0		
21	1.3.1	Detailplanung Infrastruktur	0%	grün	Bene	27.08.08	21.09.08	27.08.08	21.09.08	15,0	12,0	3,0	15,0	0,0	7.500	6.000	1.500	7.500	0		
22	1.3.2	Detailplanung HW	0%	grün	Dell	27.08.08	14.09.08	27.08.08	14.09.08	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	14.000	12.500	1.500	14.000	0		
23	1.3.3	Detailplanung SW	0%	grün	Gates	27.08.08	28.09.08	27.08.08	28.09.08	30,0	25,0	5,0	30,0	0,0	18.000	12.500	5.500	18.000	0		
24	1.3.4	Detailplanung Personal u. Organisation	0%	grün	Sprenger	27.08.08	07.09.08	27.08.08	07.09.08	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	9.500	9.500	0	9.500	0		
25	1.3.5	Abstimmung Detailplanung	0%	grün	Maier	01.10.08	03.10.08	01.10.08	03.10.08	6,0		6,0	6,0	0,0	3.000		3.000	3.000	0		
26	1.3.6	Detailplanung abgeschlossen	0%	grün		03.10.08	03.10.08	03.10.08	03.10.08			0,0		0,0			0				
27	1.4	IMPLEMENTIERUNG	0%	grün		17.09.08	11.01.09	17.09.08	11.01.09	167,0	5,0	162,0	167,0	0,0	114.000	2.500	111.500	114.000	0		
28	1.4.1	Implementierung Infrastruktur	0%	grün	Bene	24.09.08	26.10.08	24.09.08	26.10.08	20,0		20,0	20,0	0,0	10.000		10.000	10.000	0		
29	1.4.2	Implementierung HW	0%	grün	Dell	17.09.08	23.11.08	17.09.08	23.11.08	20,0	4,0	16,0	20,0	0,0	15.000	2.000	13.000	15.000	0		
30	1.4.3	Implementierung SW	0%	grün	Gates	01.10.08	04.01.09	01.10.08	04.01.09	100,0		100,0	100,0	0,0	74.500		74.500	74.500	0		
31	1.4.4	Implementierung Personal u. Organisation	0%	grün	Sprenger	19.11.08	04.01.09	19.11.08	04.01.09	12,0	1,0	11,0	12,0	0,0	7.000	500	6.500	7.000	0		
32	1.4.5	Integration	0%	grün	Maier	07.01.09	11.01.09	07.01.09	11.01.09	15,0		15,0	15,0	0,0	7.500		7.500	7.500	0		
33	1.4.6	Implementierung abgeschlossen	0%	grün		11.01.09	11.01.09	11.01.09	11.01.09			0,0		0,0			0				
34	1.5	TEST UND SCHULUNG	0%	grün		14.01.09	07.03.09	14.01.09	07.03.09	115,0	2,0	113,0	115,0	0,0	62.750	2.000	60.750	62.750	0		
35	1.5.1	Durchführung 1. Testbetrieb	0%	grün	Maier	14.01.09	01.02.09	14.01.09	01.02.09	16,0	2,0	14,0	16,0	0,0	10.000	2.000	8.000	10.000	0		
36	1.5.2	Analyse und Adaption 1. Testbetrieb	0%	grün	Maier	04.02.09	08.02.09	04.02.09	08.02.09	6,0		6,0	6,0	0,0	4.500		4.500	4.500	0		
37	1.5.3	Betaversion liegt vor	0%	grün		08.02.09	08.02.09	08.02.09	08.02.09			0,0		0,0			0				
38	1.5.4	Durchführung 2. Testbetrieb	0%	grün	Maier	11.02.09	22.02.09	11.02.09	22.02.09	22,0		22,0	22,0	0,0	12.000		12.000	12.000	0		
39	1.5.5	Schulung User	0%	grün	Doku	11.02.09	07.03.09	11.02.09	07.03.09	61,0		61,0	61,0	0,0	30.500		30.500	30.500	0		
40	1.5.6	Analyse und Adaption 2. Testbetrieb	0%	grün	Maier	25.02.09	28.02.09	25.02.09	28.02.09	9,0		9,0	9,0	0,0	5.250		5.250	5.250	0		
41	1.5.7	Abnahme	0%	grün	Maier	03.03.09	07.03.09	03.03.09	07.03.09	1,0		1,0	1,0	0,0	500		500	500	0		
42	1.5.8	Abnahme erfolgt	0%	grün		07.03.09	07.03.09	07.03.09	07.03.09			0,0		0,0			0				
43	1.6	INBETRIEBNAHME	0%	grün		10.03.09	14.03.09	10.03.09	14.03.09	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	17.000	0	17.000	17.000	0		
44	1.6.1	Inbetriebnahme HW	0%	grün	Dell	10.03.09	14.03.09	10.03.09	14.03.09	10,0		10,0	10,0	0,0	5.000		5.000	5.000	0		
45	1.6.2	Inbetriebnahme SW	0%	grün	Gates	10.03.09	14.03.09	10.03.09	14.03.09	10,0		10,0	10,0	0,0	5.000		5.000	5.000	0		
46	1.6.3	Inbetriebnahme Organisation	0%	grün	Sprenger	10.03.09	14.03.09	10.03.09	14.03.09	12,0		12,0	12,0	0,0	7.000		7.000	7.000	0		
47	1.6.4	Inbetriebnahme erfolgt	0%	grün		14.03.09	14.03.09	14.03.09	14.03.09			0,0		0,0			0				
END																					

Projektstrukturplan

EDV SYS

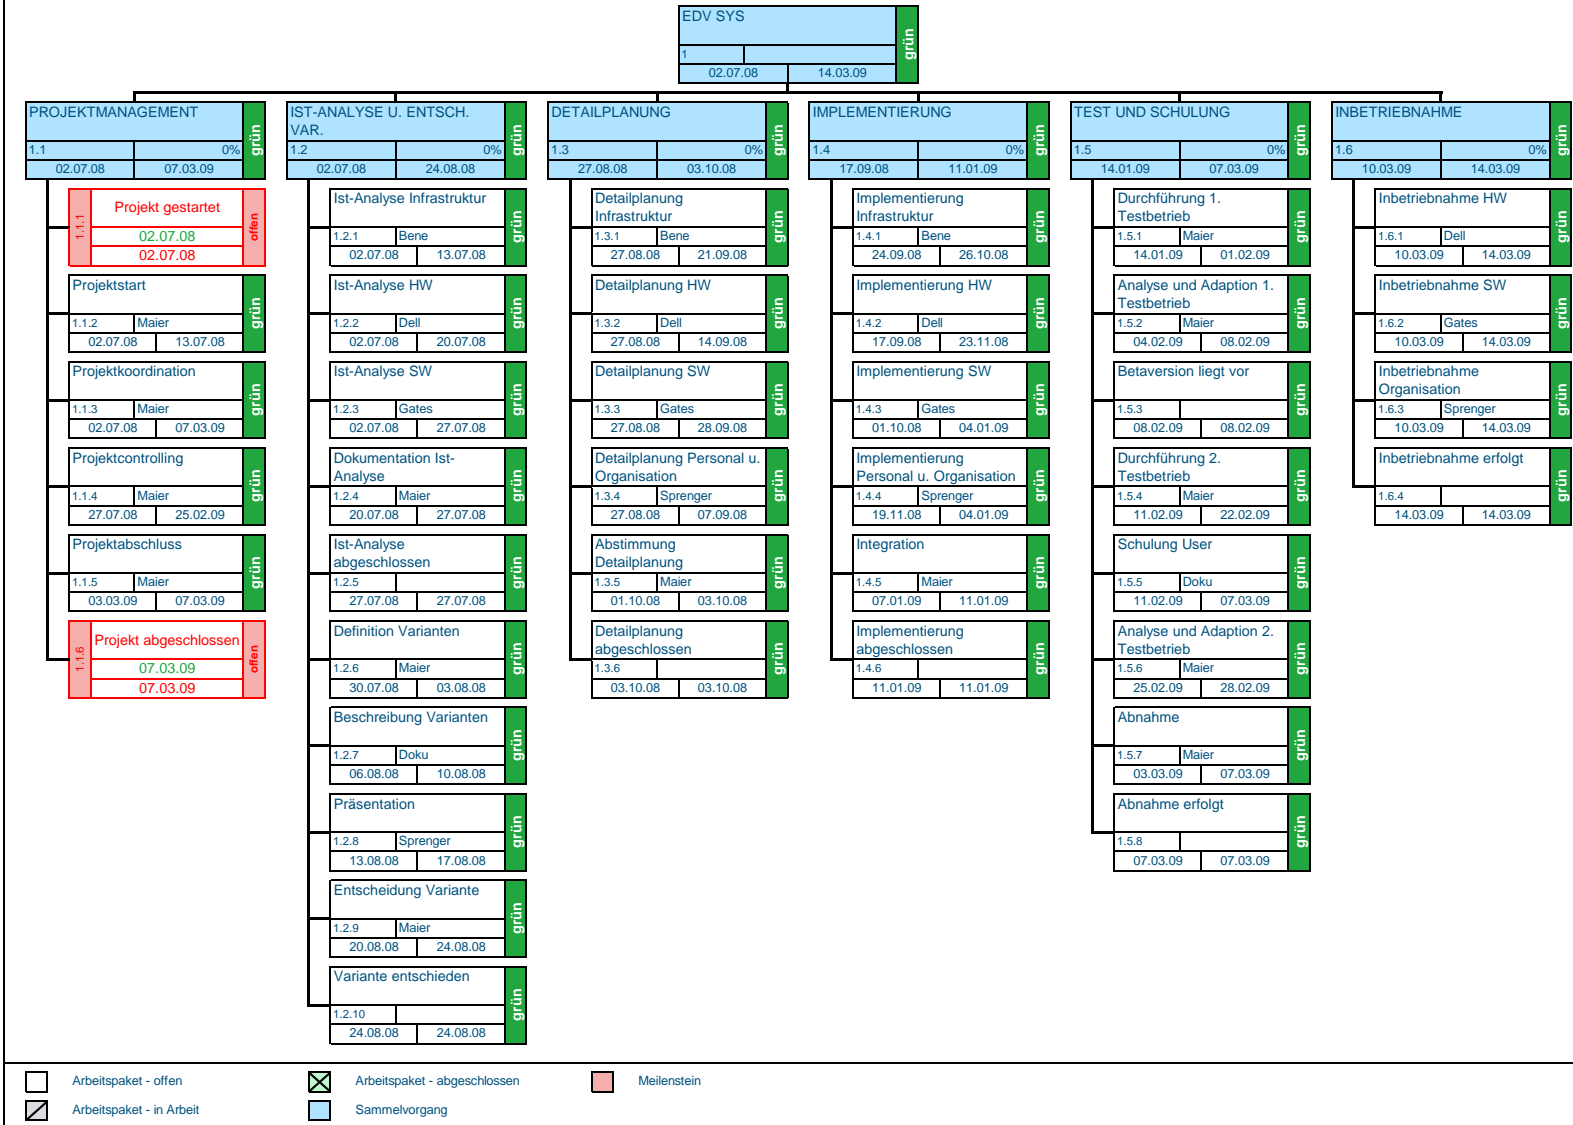

- Arbeitspaket - offen
- Arbeitspaket - abgeschlossen
- Meilenstein
- Arbeitspaket - in Arbeit
- Sammelvorgang
